



Manutenção de Estradas Rurais e Trabalhos de Recuperação Ambiental (Fase 2) – Bacia do Paraopeba

Projeto de obrigação de fazer da Vale

Objetivo:

O objetivo do projeto é elaborar e entregar um procedimento de Manutenção de Vias, assim como treinar equipes técnicas e operadores de máquinas e equipamentos responsáveis pela manutenção de estradas rurais nos 25 municípios da Bacia do Rio Paraopeba.



Onde: Abaeté, Betim, Biquinhas, Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha, Três Marias



Investimento:

Valor total previsto: R\$ 2.880.201,36

O valor total executado do projeto foi de R\$ 2.705.319,94.




Duração:

- Autorização para início do projeto em abril de 2022.
- Conclusão dos treinamentos e capacitações em outubro de 2023.




Resumo do Desenho do Projeto

Manutenção de Estradas Rurais e Trabalhos de Recuperação Ambiental (Fase 2) – Bacia do Paraopeba

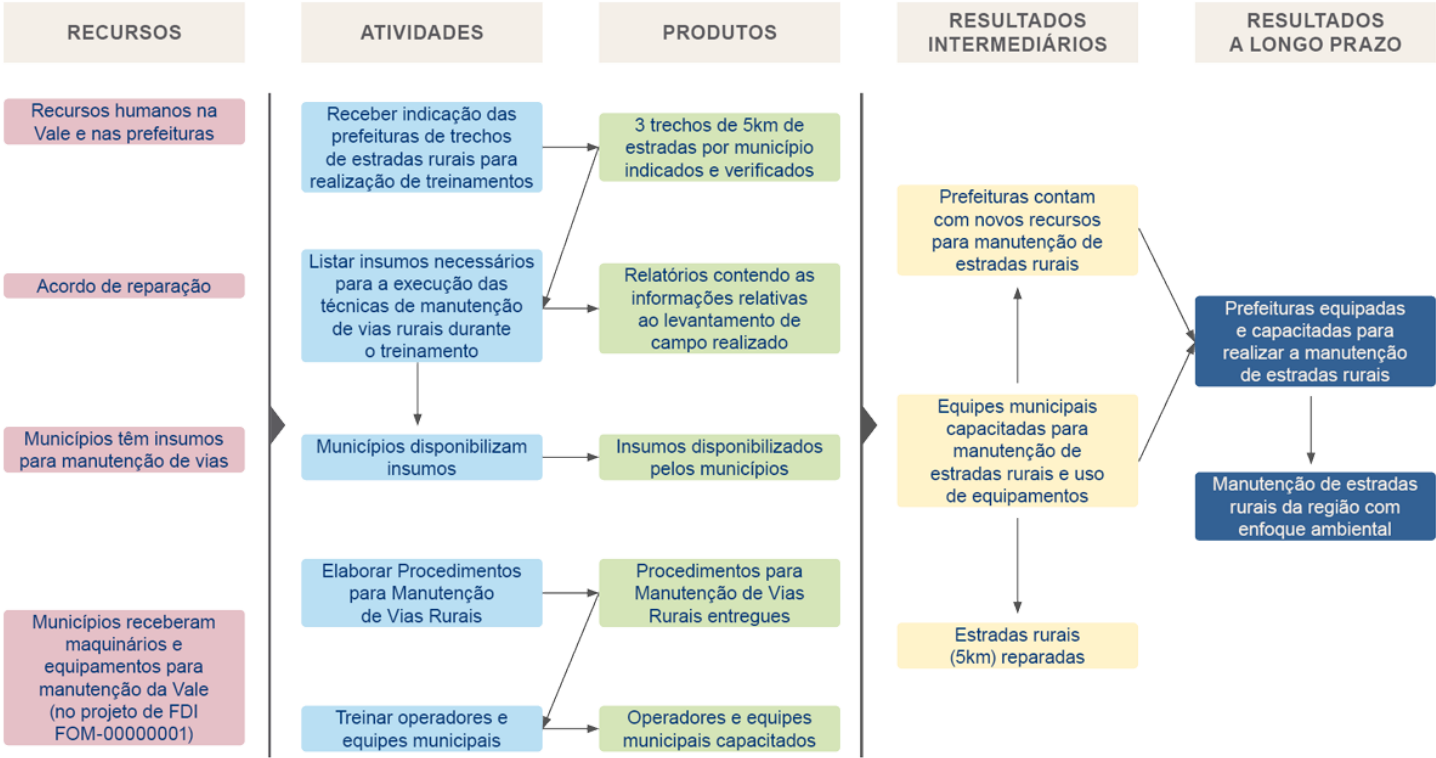

Linha do Tempo

Manutenção de Estradas Rurais e Trabalhos de Recuperação Ambiental (Fase 2) – Bacia do Paraopeba

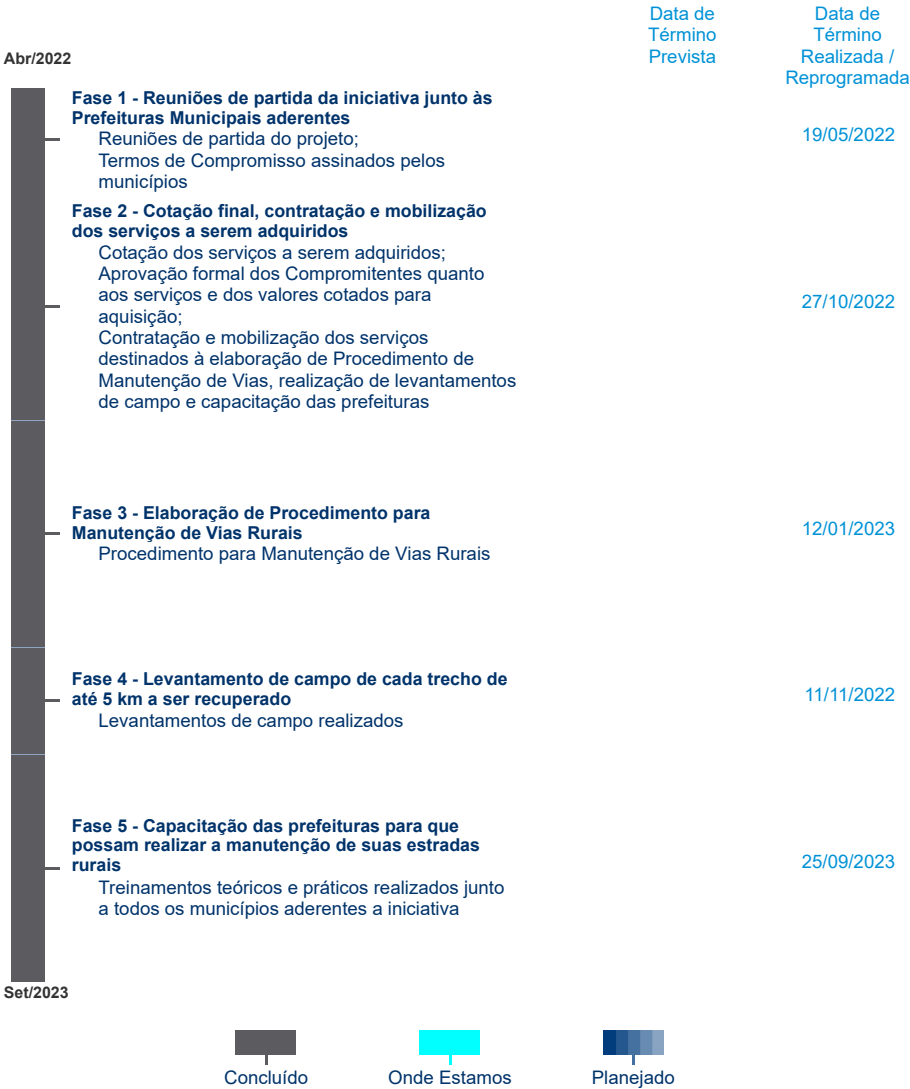

Fonte: Elaboração própria (2023), a partir do cronograma enviado pela Vale em 27/09/23. Data de Status: 25/09/2023.

Avanço Físico


Manutenção de Estradas Rurais e Trabalhos de Recuperação Ambiental (Fase 2) – Bacia do Paraopeba

9
PRODUTO(S)
PREVISTO(S)

9
PRODUTO(S)
ENTREGUE(S)


0
PRODUTO(S)
EM ATRASO

Gráfico 1 – Percentual de Execução das Atividades do Projeto

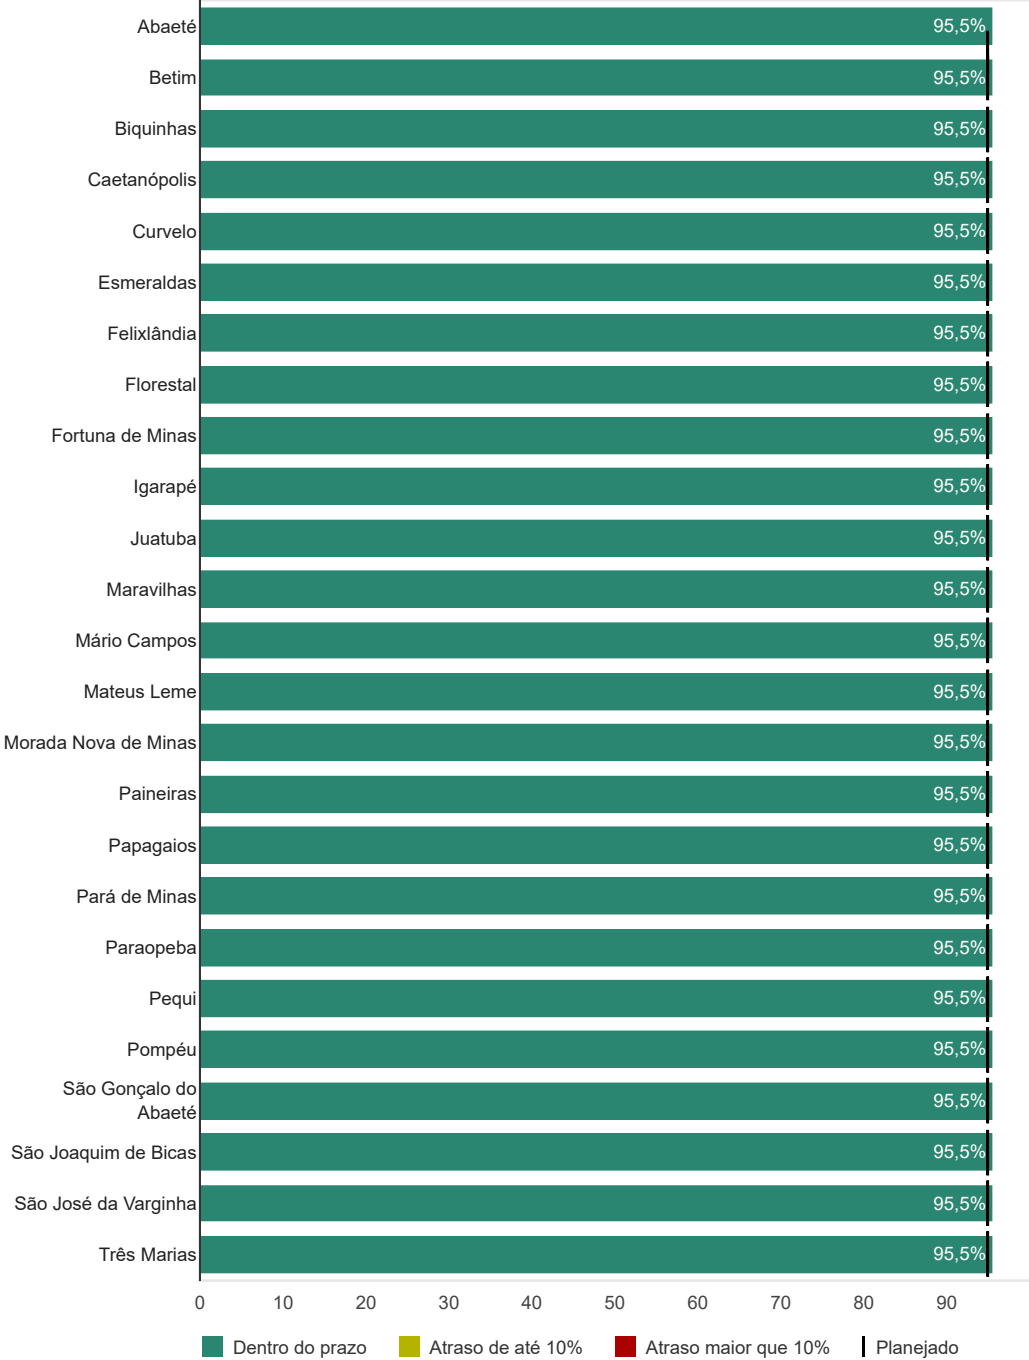

Fonte: Elaboração própria (2023), a partir do cronograma enviado pela Vale em 27/09/23. Data de Status: 25/09/23.
Nota: o cronograma apresenta atividades internas da Vale relativas ao encerramento do projeto, e que não são computadas como parte da sua execução. Desta forma, o percentual máximo a ser considerado de execução do projeto é de 95%, excluindo-se os 5% relativos à Fase de Encerramento.

Gráfico 2 – Percentual de Produtos Entregues

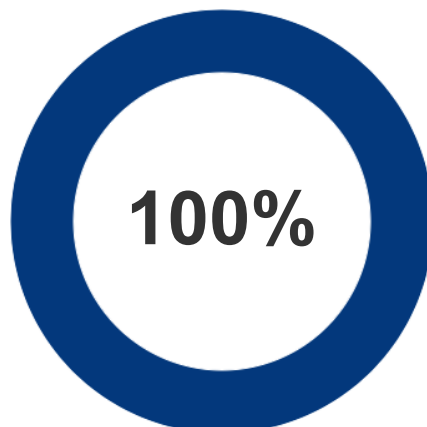

Fonte: Elaboração própria (2023), a partir de documentos recebidos até 27/09/2023.




Atividades Realizadas

Em 26/01/2024 os Compromitentes concederam à Vale a quitação integral do projeto por meio do Ofício Compromitentes nº 447/2024.

Avanço Financeiro

Manutenção de Estradas Rurais e Trabalhos de Recuperação Ambiental (Fase 2) – Bacia do Paraopeba

Gráfico 3 – Percentual Realizado do Projeto

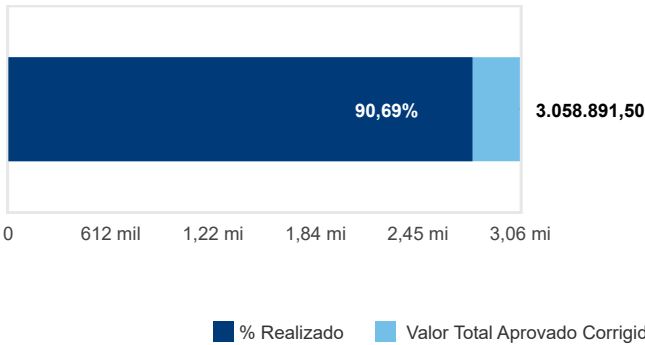


Fonte: Elaboração própria (2023), a partir de informações fornecidas pela Vale até 11/12/2023.



O avanço financeiro do projeto é apresentado no Gráfico 3, por meio do percentual realizado em relação ao valor total aprovado corrigido. O percentual de execução financeira da iniciativa foi de 90,69%.

Gráfico 4 – Percentual Realizado por Município

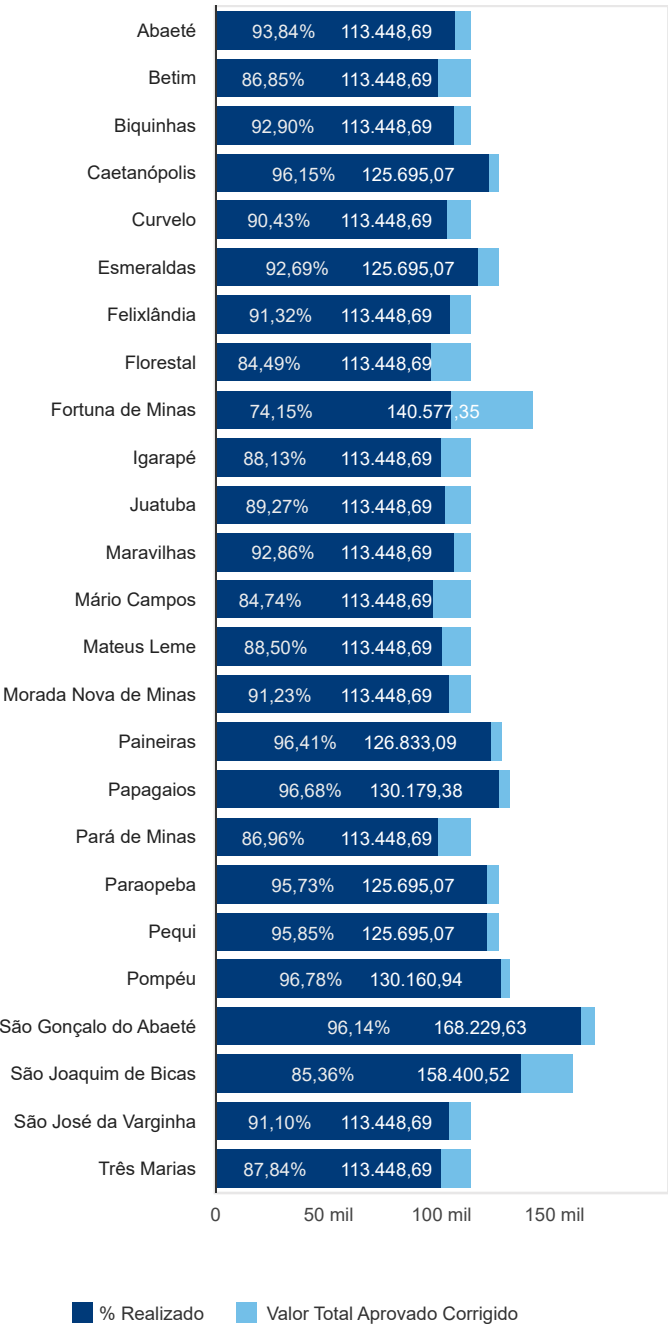

Fonte: Elaboração própria (2023), a partir de informações fornecidas pela Vale até 11/12/2023.



O Gráfico 4 apresenta o percentual realizado por município aderente em relação ao valor total aprovado e corrigido pelo IPCA, conforme determina o Acordo Judicial.

Registro Fotográfico (Acervo FGV)

Manutenção de Estradas Rurais e Trabalhos de Recuperação Ambiental (Fase 2) – Bacia do Paraopeba



Registro fotográfico de Vistoria realizada em Mai/23. em Papagaios.



Registro fotográfico de Vistoria realizada em Mai/23. em Papagaios.



Registro fotográfico de Vistoria realizada em Mai/23. em Papagaios.
