

OBRAS



Pavimentação e Recapeamento de Vias Diversas – Maravilhas

Projeto convertido em obrigação de pagar da Vale

Objetivo:

O objetivo do projeto é a pavimentação e recapeamento de 16,79 quilômetros (km) de vias no município de Maravilhas (MG). Especificamente, o projeto contempla a pavimentação de 15,31 quilômetros (km) de estradas e a revitalização e pavimentação de 1,48 quilômetros (km) de vias urbanas. Esta iniciativa foi convertida em obrigação de pagar da Vale e será executada pela Prefeitura de Maravilhas.



Onde: Maravilhas

Av. Bandeirantes; Rua Paulo Campos Guimarães; Praça José Augusto Camargos; Rua Emilio Vasconcelos da Costa; Rua José Duarte de Sá e Castro; Rua Palmeiras; Maravilhas à São José de Chácara; São José de Chácara à Catita de Baixo; Maravilhas à Boa Vista



Investimento:

Valor total previsto: R\$ 51.231.076,48
Data de Repasse à Prefeitura: 13/10/2023




Duração:

A iniciativa teve ordem de início emitida pelos Compromitentes no dia 16/10/2023. O cronograma e a duração previstos para o projeto foram definidos pela Prefeitura de Maravilhas dentro do limite indicado pela FGV. Para referência, o prazo máximo estimado pela FGV foi de 34 meses.



Resumo do Desenho do Projeto

Pavimentação e Recapeamento de Vias Diversas – Maravilhas

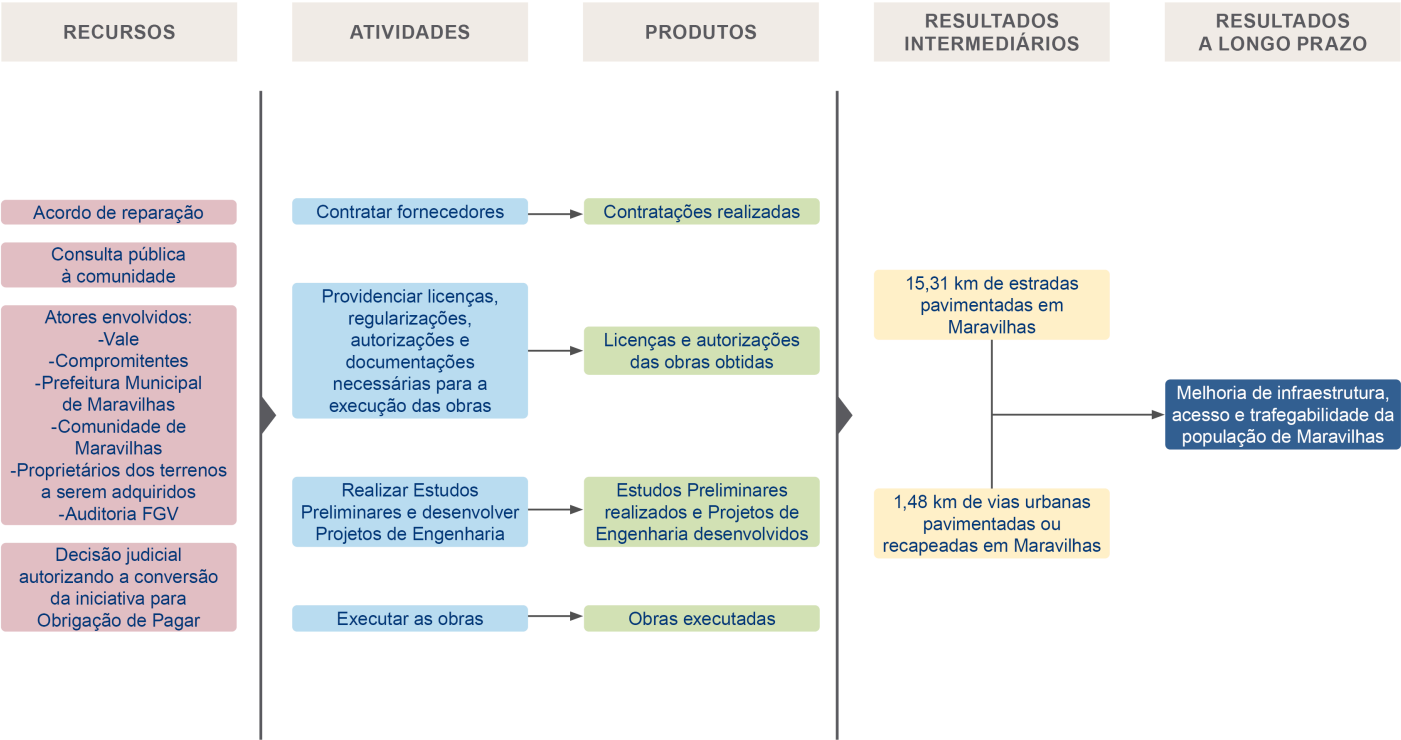

Linha do Tempo

Pavimentação e Recapeamento de Vias Diversas – Maravilhas

	Data de Término Prevista	Data de Término Realizada / Reprogramada
Out/2023		
Etapa 1 - Desenvolvimento Contratações preliminares Contratação da empresa para realização de estudos preliminares (sondagem e etc)	26/10/2023	26/10/2023
Etapa 1 - Desenvolvimento Contratações preliminares Contratação da empresa projetista	20/11/2023	20/11/2023
Etapa 1 - Desenvolvimento Contratações Preliminares Contratação da empresa executora (empreiteira)	21/12/2023	21/12/2023
Etapa 1 - Desenvolvimento Desenvolvimento da Engenharia Estudos preliminares	20/11/2023	20/11/2023
Etapa 1 - Desenvolvimento Desenvolvimento da Engenharia Elaboração dos projetos cabíveis (conceitual/básico)	20/12/2023	20/12/2023
Etapa 1 - Desenvolvimento Desenvolvimento da Engenharia Elaboração dos projetos cabíveis (detalhado/executivo)	20/12/2023	20/12/2023
Etapa 1 - Desenvolvimento Desenvolvimento da Engenharia Obtenção de licenças para implantação	21/12/2023	21/12/2023
Dez/2023		

Etapa 2 - Implantação da Obra



Fonte: Elaboração própria (2025), a partir de informações apuradas junto à Prefeitura.

Nota: Considerando que a Prefeitura Municipal não forneceu informações das datas do monitoramento de marcos mínimos para este projeto no período de referência até o prazo acordado, não foi possível atualizar as informações da linha do tempo. Assim, a linha do tempo reflete as últimas informações disponibilizadas pelo município, publicadas em dezembro de 2024.




Atividades Realizadas

A Prefeitura Municipal não respondeu o formulário com a solicitação de informações para o monitoramento deste projeto até o prazo acordado. Desta forma, não haverá reporte de informações sobre atividades realizadas neste período.

Avanço Financeiro

Pavimentação e Recapeamento de Vias Diversas – Maravilhas

Gráfico 1 – Percentual Realizado do Projeto

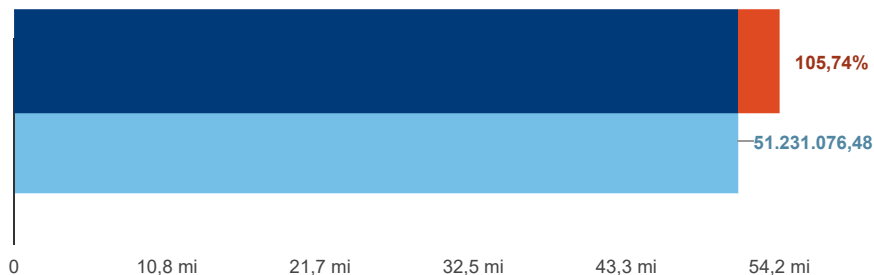

■ % Realizado ■ Valor Total ■ % Excedente Realizado

Fonte: Elaboração própria (2025), a partir de informações fornecidas pelo município até agosto de 2025.



O avanço financeiro do projeto é apresentado no Gráfico 1, por meio do percentual realizado até o momento em relação ao valor total repassado ao município. O percentual de execução financeira da iniciativa é 105,74%.

✓ **Avanço Físico**

A Prefeitura Municipal não forneceu informações sobre as datas dos marcos mínimos do projeto para o monitoramento no período de referência, até o prazo acordado. Desta forma, não haverá reporte de informações sobre avanço físico para este período.

Registro Fotográfico (Acervo FGV)

Pavimentação e Recapeamento de Vias Diversas – Maravilhas



Constatação de pavimentação e drenagem superficial da estrada de Maravilhas a São José da Chácara. Vistoria realizada em março/24.



Constatação de pavimentação da estrada de Maravilhas a São José da Chácara. Vistoria realizada em março/24.



Constatação de recapeamento de vias do centro. Vistoria realizada em março/24.
