



Programa de Educação Profissional – Municípios da Bacia do Paraopeba

Projeto de obrigação de fazer da Vale

Objetivo:

O objetivo do projeto é oferecer cursos de qualificação profissional buscando gerar oportunidades de trabalho e maior renda para a população local.



Onde: Abaeté, Betim, Biquinhas, Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha, Três Marias



Investimento:

Valor total previsto: R\$ 13.387.102,52

O orçamento estimado da iniciativa foi atualizado por meio do fluxo de "Gestão de Mudança".




Duração:

- Autorização para início do projeto em janeiro de 2022.
- Estimativa de conclusão do projeto em abril de 2026.



Resumo do Desenho do Projeto


Programa de Educação Profissional – Municípios da Bacia do Paraopeba

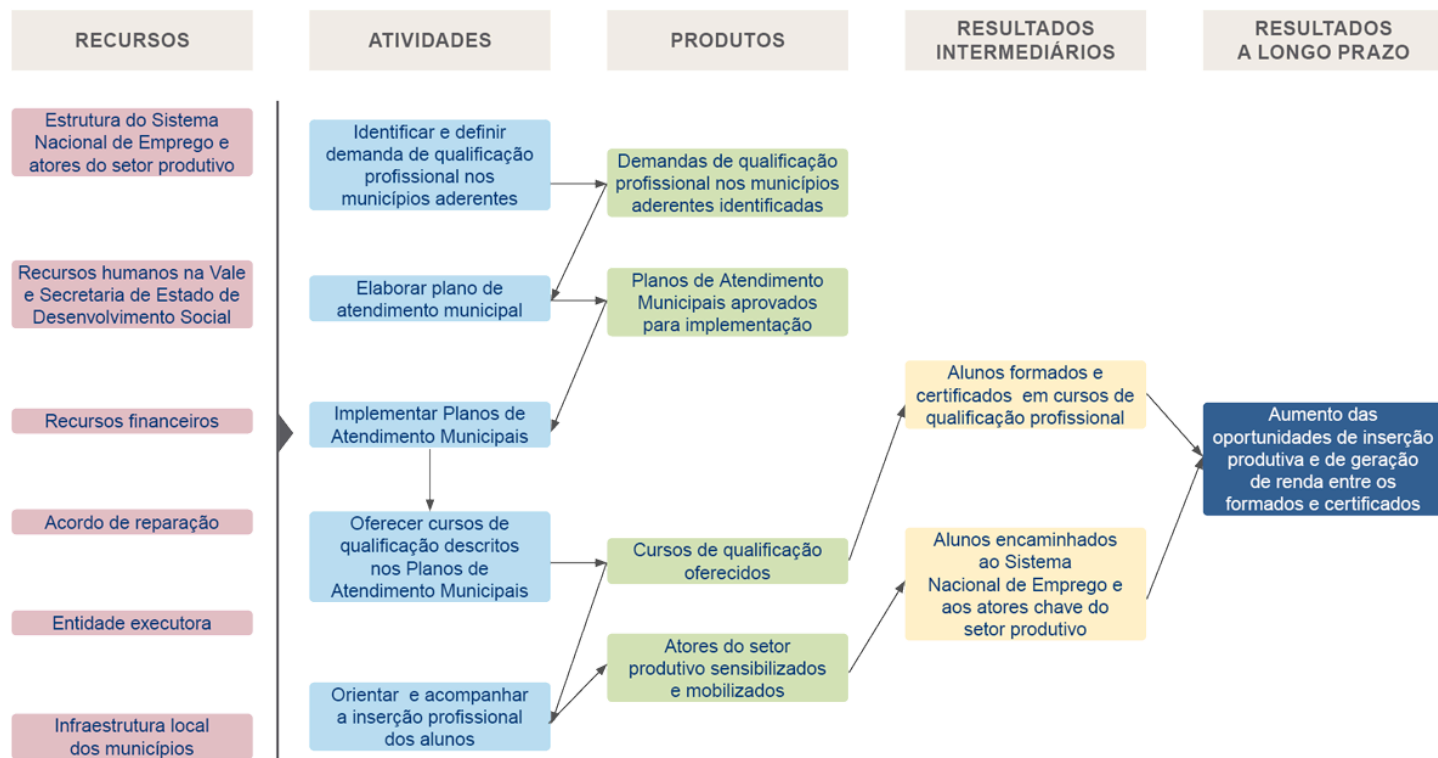

Linha do Tempo

Programa de Educação Profissional – Municípios da Bacia do Paraopeba

	Data de Término Prevista	Data de Término Realizada / Reprogramada
Jan/2022		
Fase 1 - Identificação/Definição Assinatura dos Termos de Compromisso pelos municípios aderentes; Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico	03/03/2022	01/05/2022
Fase 2 - Planejamento Reunião de Partida do Projeto realizada; Contratação de Entidade Executora	04/08/2022	04/08/2022
Fase 2 - Planejamento Elaboração e validação dos Planos de Atendimento Municipais	25/11/2022	25/11/2022
Fase 3 - Execução Contratação das Entidades de Educação Ofertantes Oferta dos cursos de qualificação profissional	23/09/2025	04/08/2025
Fase 3 - Execução Relatórios semestrais de execução entregues (1/6)	31/03/2023	31/03/2023
Fase 3 - Execução Relatórios semestrais de execução entregues (2/6)	25/09/2023	25/09/2023
Fase 3 - Execução Relatórios semestrais de execução entregues (3/6)	21/03/2024	21/03/2024
Fase 3 - Execução Relatórios semestrais de execução entregues (4/6)	16/09/2024	16/09/2024
Fase 3 - Execução Relatórios semestrais de execução entregues (5/6)	13/03/2025	13/03/2025

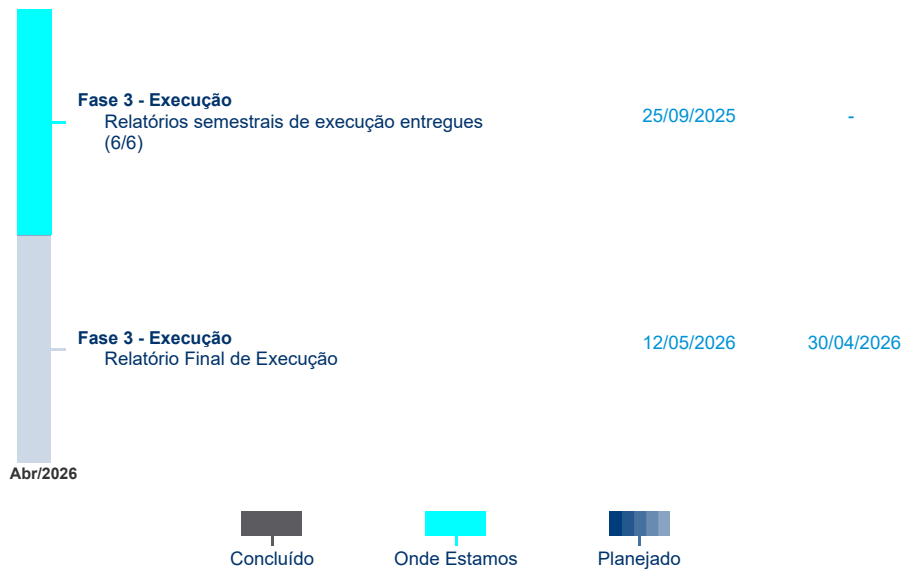

Fonte: Elaboração própria (2025), a partir dos cronogramas enviados pela Vale em 28/07/2025. Data de Status: 20/07/2025.

Nota: O término da subfase “Oferta dos cursos de qualificação profissional” ocorre junto ao término da realização das matrículas dos últimos cursos ofertados. Após essa data, os cursos serão iniciados, não necessariamente de forma imediata, e sua duração varia conforme definições da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais.

Avanço Físico

Programa de Educação Profissional – Municípios da Bacia do Paraopeba


13

PRODUTO(S)
PREVISTO(S)

11


PRODUTO(S)
ENTREGUE(S)

0

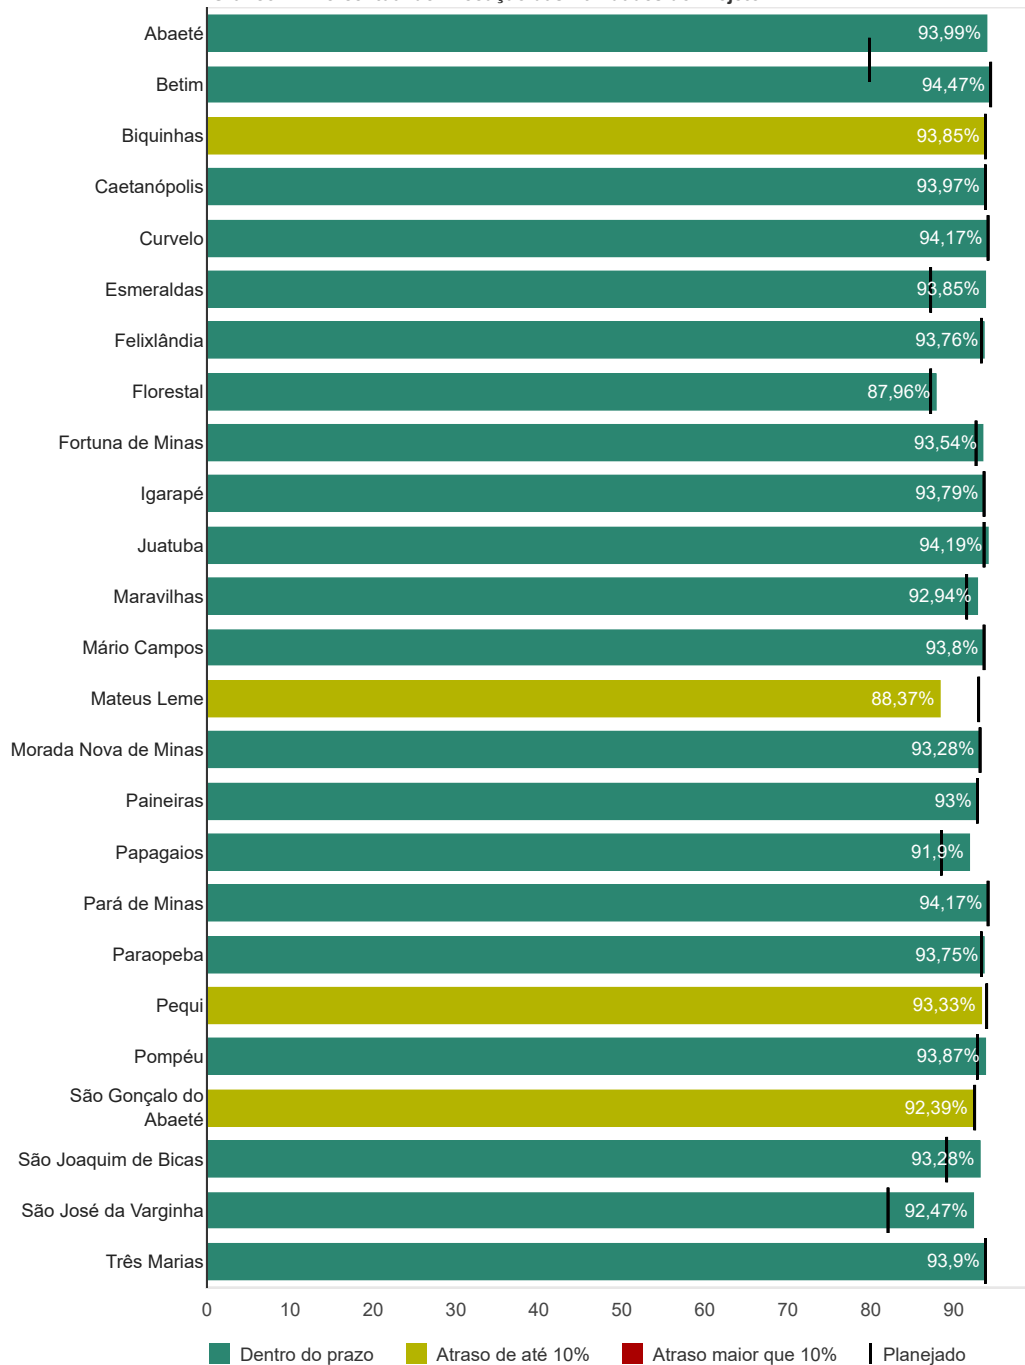PRODUTO(S)
EM ATRASO**Gráfico 1 – Percentual de Execução das Atividades do Projeto**

Fonte: Elaboração própria (2025), a partir dos cronogramas enviados pela Vale em 28/07/25. Data de Status: 20/07/2025.

Gráfico 2 – Percentual de Produtos Entregues

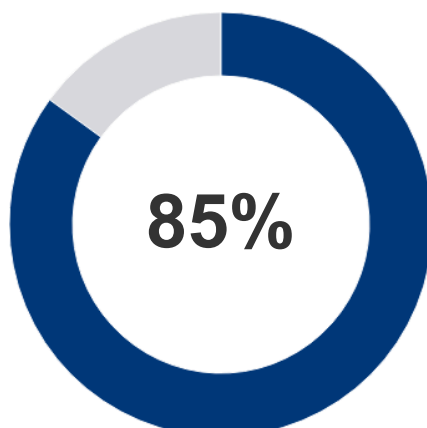

Fonte: Elaboração própria (2025), a partir de documentos recebidos até 11/08/2025.

✓ Cursos em andamento no período						
Município	Início	Término	Nome do Curso	Bloco	Nº de Vagas Ofertadas	Nº de Alunos Matriculados
Florestal	08/07/2025	13/08/2025	Assistente Financeiro (Presencial)	Bloco 4	20	NA
Florestal	15/07/2025	29/09/2025	Confeccionador de Lingerie e Moda Praia (Presencial)	Bloco 4	20	NA
Fortuna de Minas	28/04/2025	22/07/2025	Confeiteiro (Presencial)	Bloco 4	20	NA
Maravilhas	20/05/2025	31/07/2025	Costureiro de Máquina Reta e Overlock (Presencial)	Bloco 3	20	NA
Mateus Leme	24/06/2025	06/08/2025	Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Presencial)	Bloco 4	20	NA
Mateus Leme	07/07/2025	01/08/2025	Assistente de Contabilidade (Presencial)	Bloco 4	NA	NA
Mateus Leme	04/08/2025	05/09/2025	Confeiteiro (Presencial)	Bloco 4	NA	NA
Papagaios	02/07/2025	29/07/2025	Recepcionista (Presencial)	Bloco 4	NA	NA
São Gonçalo do Abaeté	13/05/2025	22/07/2025	Assistente de Secretaria Escolar (Presencial)	Bloco 3	20	NA
São José da Varginha	26/06/2025	29/07/2025	Salgadeiro (Presencial)	Bloco 4	20	NA


Fonte: Elaboração própria (2025), a partir de dados enviados pela Vale em 28/07/2025.

Nota: Número de alunos matriculados aferido até o dia 30/06/2025. No período foram identificadas inconsistências relativas a alguns dados informados pela Vale de diferentes cursos e, por este motivo, não serão reportadas as informações relativas ao número de matriculados até que sejam apuradas. Foi aberta por esta auditoria uma Não Conformidade para tratar a questão.

Avanço Financeiro

Programa de Educação Profissional – Municípios da Bacia do Paraopeba

Gráfico 3 – Percentual Realizado do Projeto




■ % Realizado ■ Valor Total Aprovado Corrigido

Fonte: Elaboração própria (2025), a partir de informações fornecidas pela Vale até 11/08/2025.



O avanço financeiro do projeto é apresentado no Gráfico 3, por meio do percentual realizado até o momento em relação ao valor total aprovado corrigido. O percentual de execução financeira da iniciativa é 79,80%.

Gráfico 4 – Percentual Realizado por Município

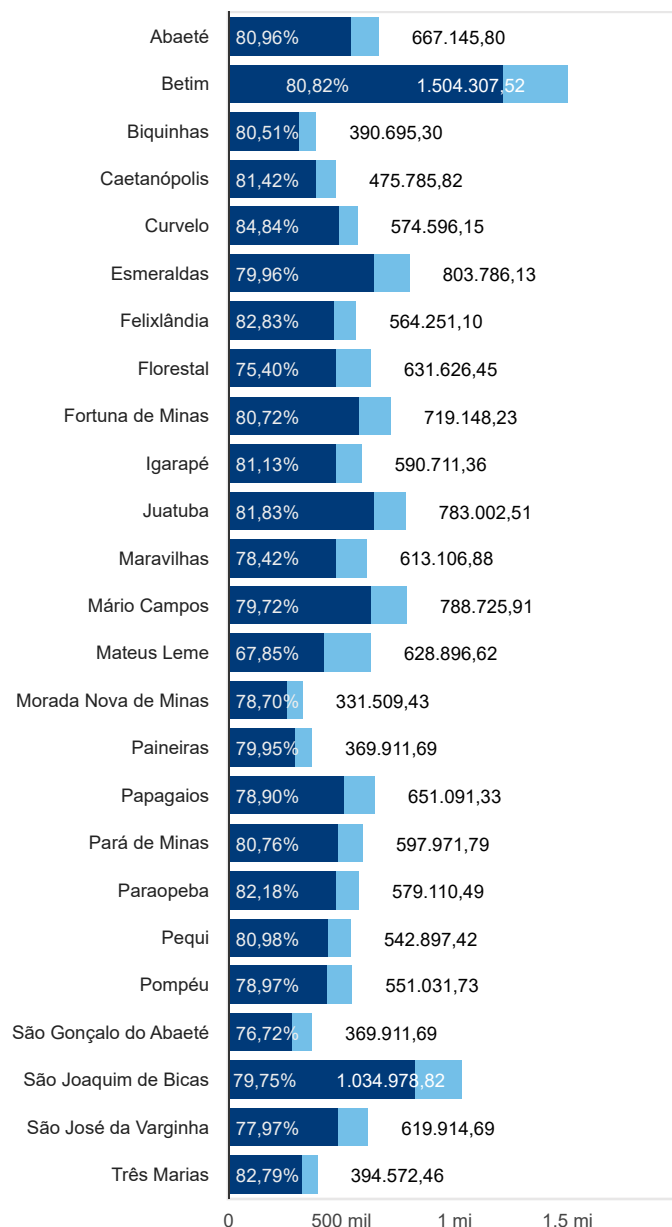

■ % Realizado ■ Valor Total Aprovado Corrigido

Fonte: Elaboração própria (2025), a partir de informações fornecidas pela Vale até 11/08/2025.



O Gráfico 4 apresenta o percentual realizado por município aderente em relação ao valor total aprovado e corrigido pelo IPCA, conforme determina o Acordo Judicial.

Registro Fotográfico (Acervo FGV)

Programa de Educação Profissional – Municípios da Bacia do Paraopeba



Registro fotográfico de Vistoria realizada em nov/23 em São Joaquim de Bicas.



Registro fotográfico de Vistoria realizada em nov/23 em São Joaquim de Bicas.



Registro fotográfico de Vistoria realizada em nov/23 em São Joaquim de Bicas.
